



Facultad de
Ingeniería



AVANCE 2 DE PROYECTO EVALUAPARES

04/08/26 - 04/30/26



Mtro. José Martín Olguín Espinoza

**Formulación y Evaluación de
Proyectos**

HECHO POR ALEJANDRO CASTRO RENTERIA

26 ABRIL DE 2026



OBJECTIVOS Y RESULTADOS CLAVE (OKR)

Objetivo:

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el proceso de revisión por pares de documentos académicos de manera estructurada y eficiente.

Resultados Clave:



Implementar autenticación y control de roles:

- *Autor*
- *Revisor*
- *Administrador*



Permitir la carga y visualización de documentos PDF con control de versiones funcional.




Registrar y almacenar al menos:

- *Comentarios de revisores*
- *Historial de versiones*
- *Estado del documento*




Lograr que el sistema complete correctamente un flujo completo:

- *Subir documento*
- *Asignar revisor*
- *Realizar revisión*
- *Emitir resultado*



INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)



KPI	Métrica	Meta
Documentos cargados correctamente	% éxito	$\geq 95\%$
Número de errores por sesión.	%	$\leq 5\%$
Tiempo de carga de PDF	Segundos	$\leq 5\text{ s}$
Versiones por documento	Promedio	≥ 2
Satisfacción del usuario	Escala 1–5	≥ 4


AVANCE DE TAREAS

Avance General

- ¿Cuántas horas de trabajo se han realizado?
- ¿Qué tanto de las tareas se han hecho?

Otros Datos Relevantes


- Tareas Terminadas: 10
- Tareas Restantes: 12
- Tareas Atrasadas: 9
- Tareas Adelantadas: 1
- Horas de Trabajo Realizadas: 65
- Horas de Trabajo Restantes: 67

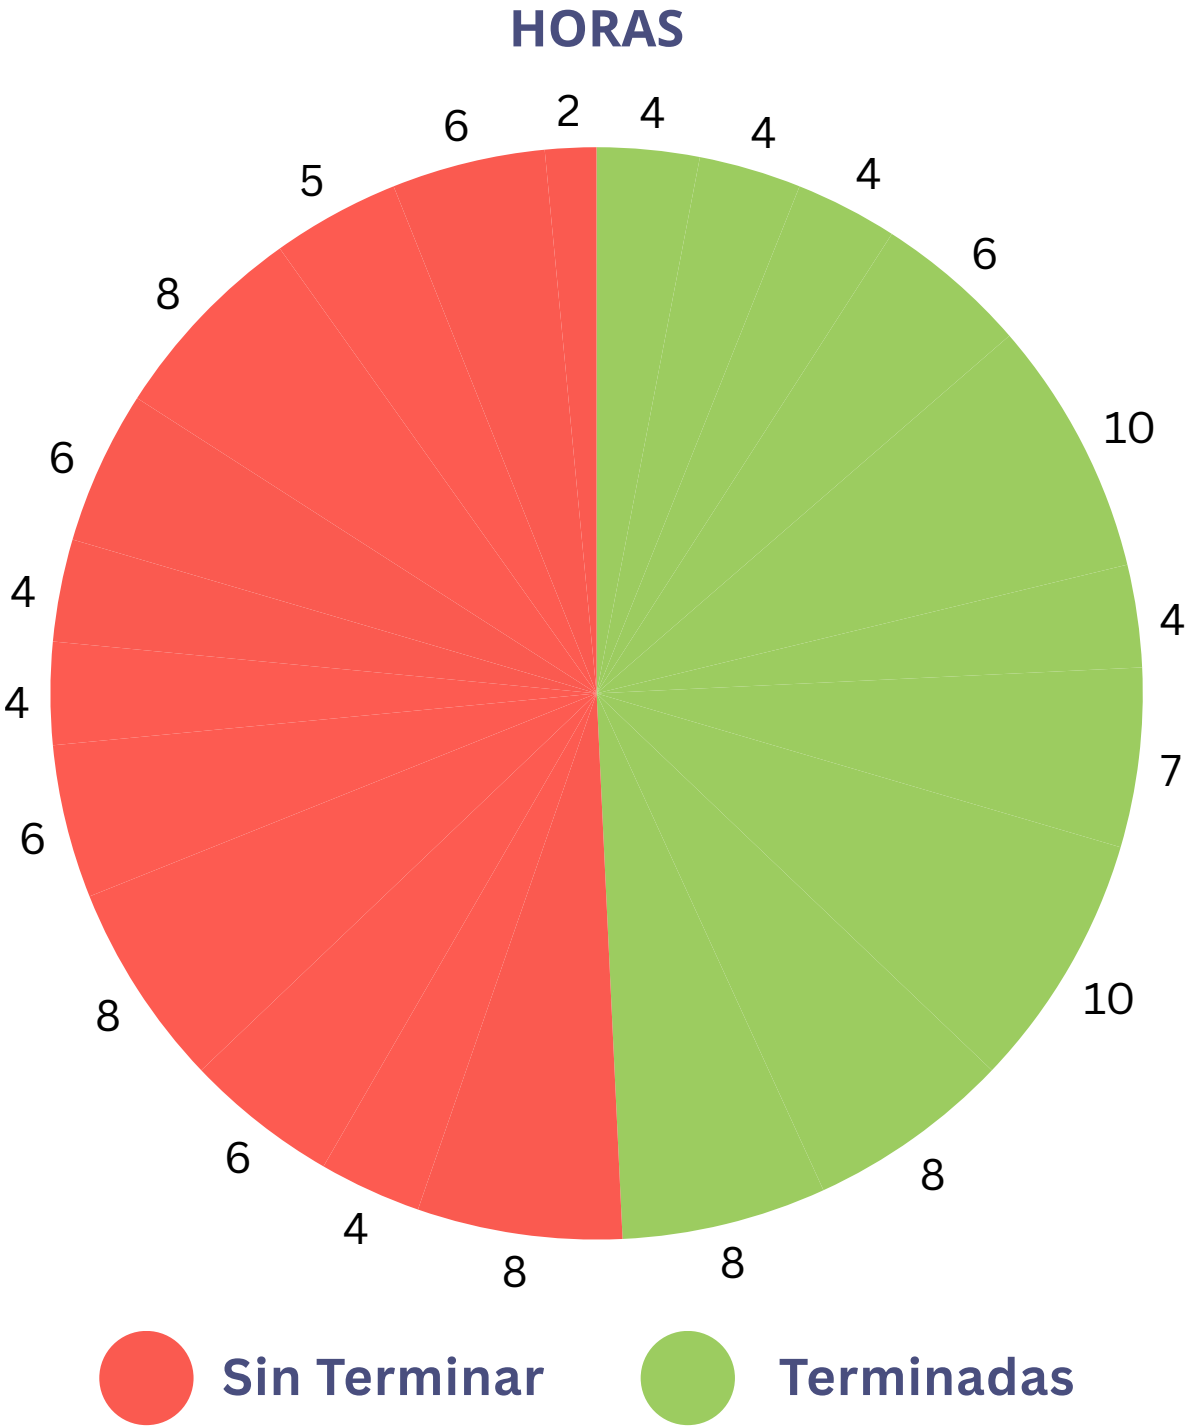

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

#	Actividad	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
0	Definición de Proyecto	■ ■ ■ ■ ■			
1	Investigar sobre Google Apps Script.		■ ■ ■		
2	Realizar reporte sobre Google Apps Script.		■ ■ ■		
3	Crear prototipo simple de una aplicación con Google Apps Scripts.		■ ■ ■		
4	Crear el diseño de la UI.		■ ■ ■		
5	Implementar diseño de UI con HTML.		■ ■ ■		
6	Crear plantilla simple de backend.		■ ■ ■		
7	Implementar modelo de datos en persistencia.		■ ■ ■		
8	Implementar comunicación con persistencia y operaciones CRUD.		■ ■ ■		
9	Desarrollar sistema de gestion de trabajos.		■ ■ ■		
10	Desarrollar asignación de revisores.		■ ■ ■		
11	Desarrollar sistema de observaciones y retroalimentación.		■ ■ ■		
12	Implementar evaluaciones anónimas (Revisión Doble Ciego).		■ ■ ■		
Terminados		■ ■ ■ ■ ■			
Faltantes		■ ■ ■ ■ ■			
Semana Actual		■ ■ ■ ■ ■			


AVANCE EN PAQUETES DE TRABAJO

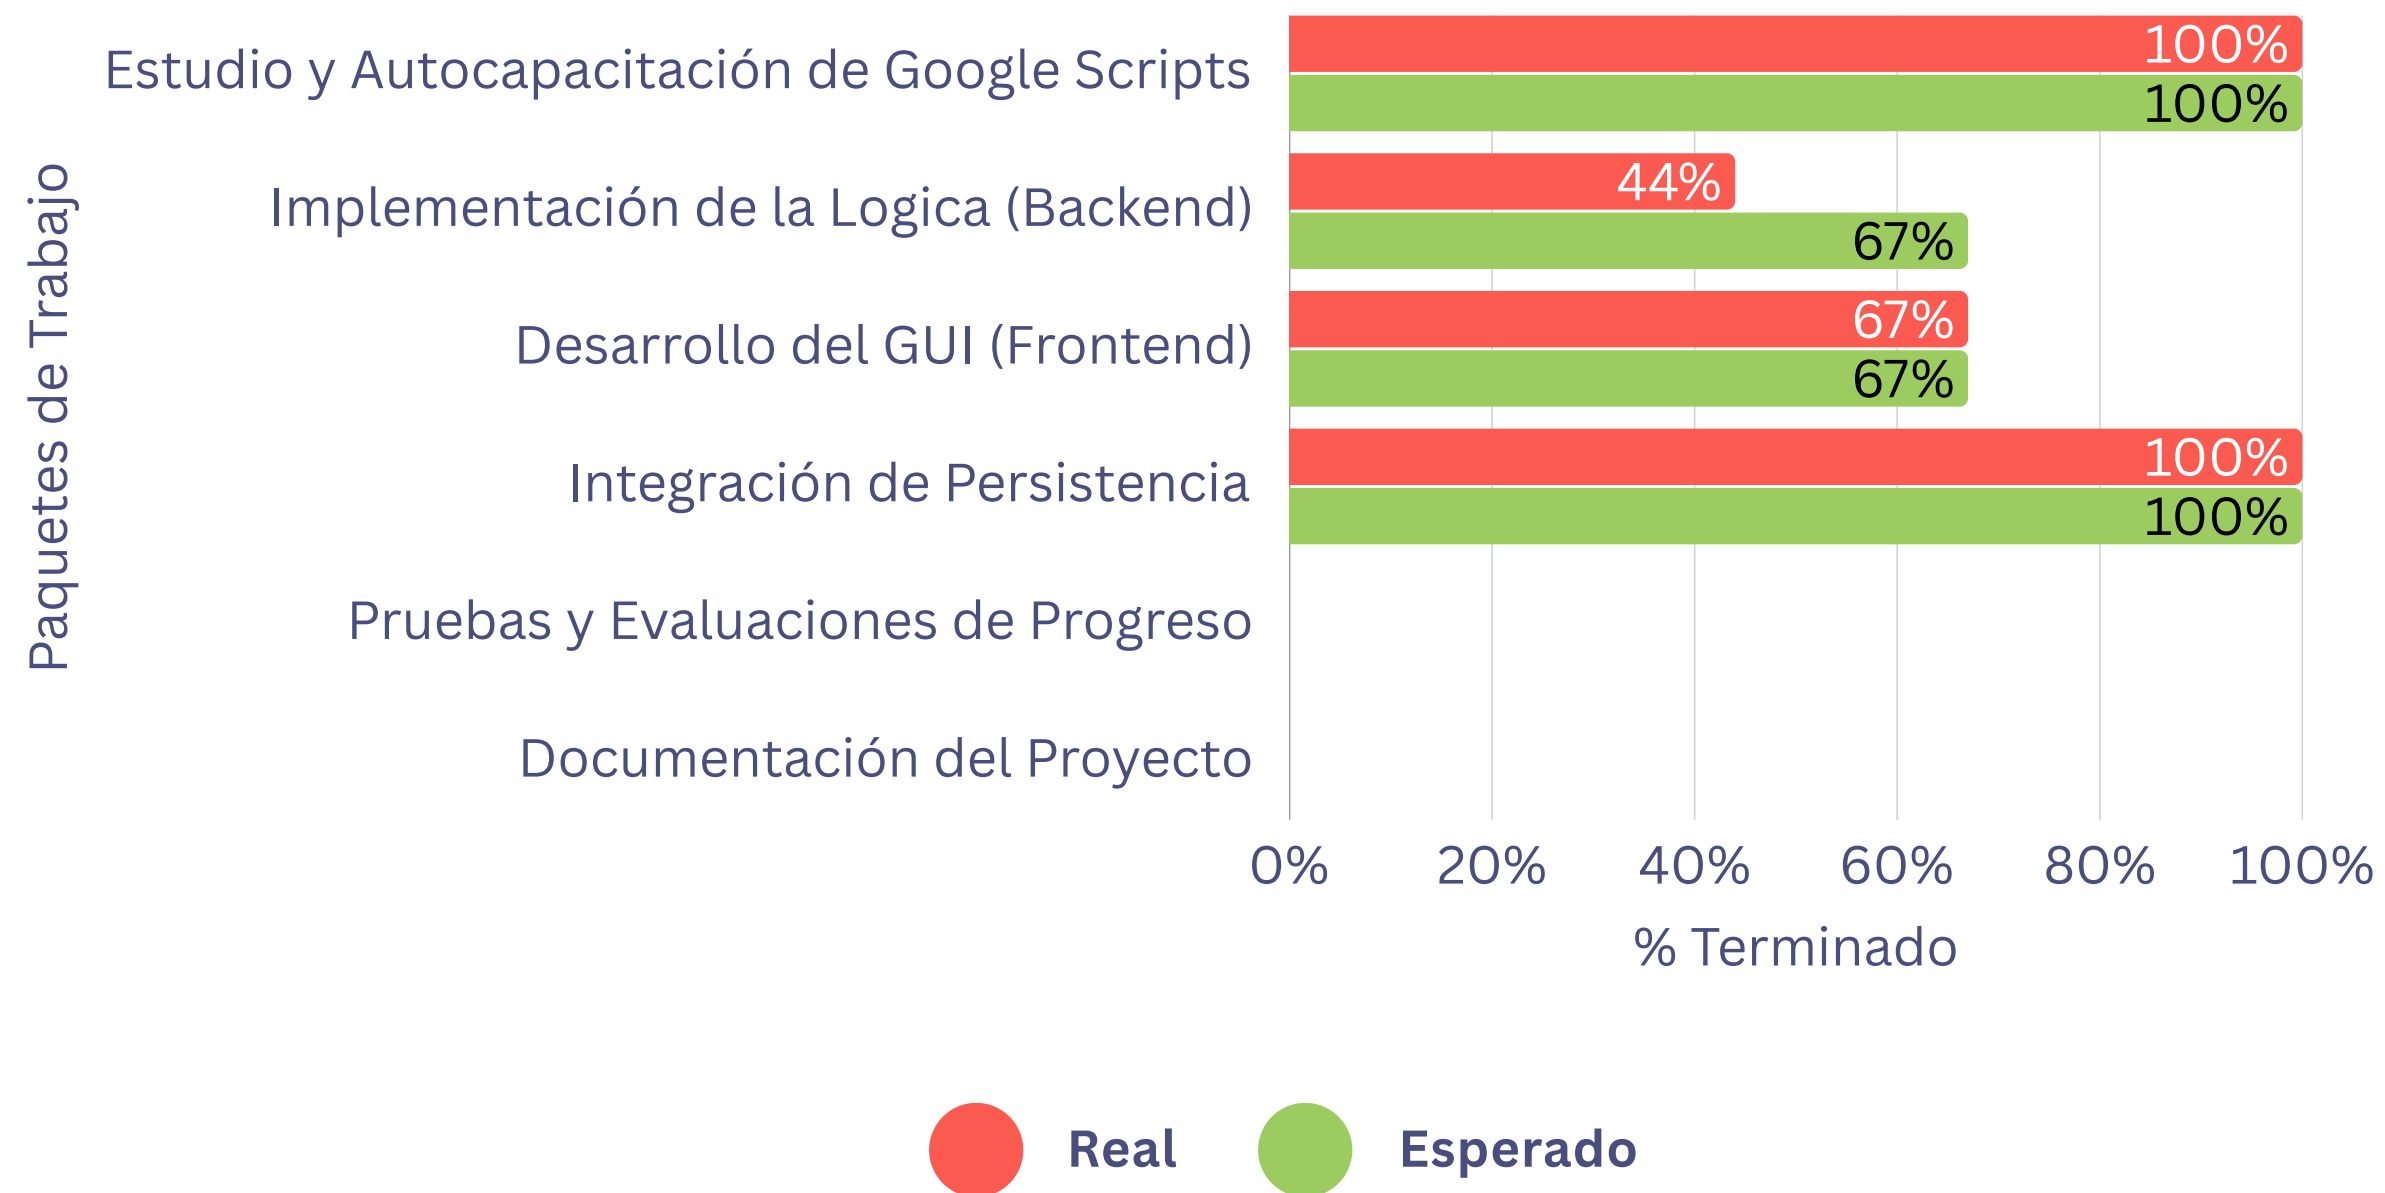

INCIDENCIAS

Incidencias En Paquetes de Trabajo

- ¿En Qué Paquetes de Trabajo Hubo Incidente?
- ¿Cuántos Incidentes se Resolvieron?

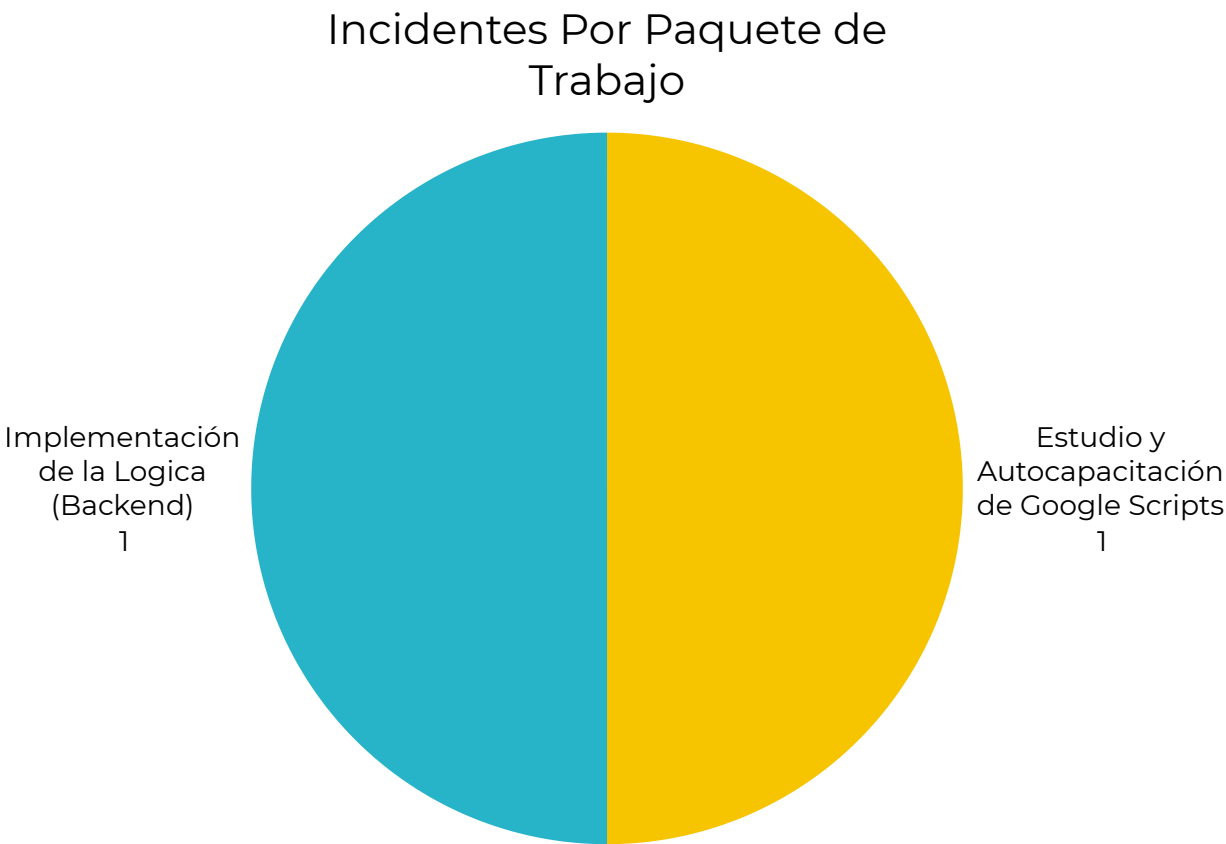


Otros Datos Relevantes

- Incidencias Resueltas: 1
- Incidencias Sin Resolver: 1

Bitacora de Incidencias

ID incidente	Fecha	Tarea afectada	Descripción del incidente	Responsable
INC-001	03/24/2026	Crear prototipo simple de una aplicación con Google Apps Scripts	Inicio tarde del prototipo, provocando que se perdiera 1 semana y media de trabajo.	Alejandro Castro
INC-002	04/20/2026	Desarrollar sistema de gestión de trabajos.	Inconsistencias con patrón de estructura de código (patrón arquitectónico) con mi equipo.	Alejandro Castro

PRESUPUESTO

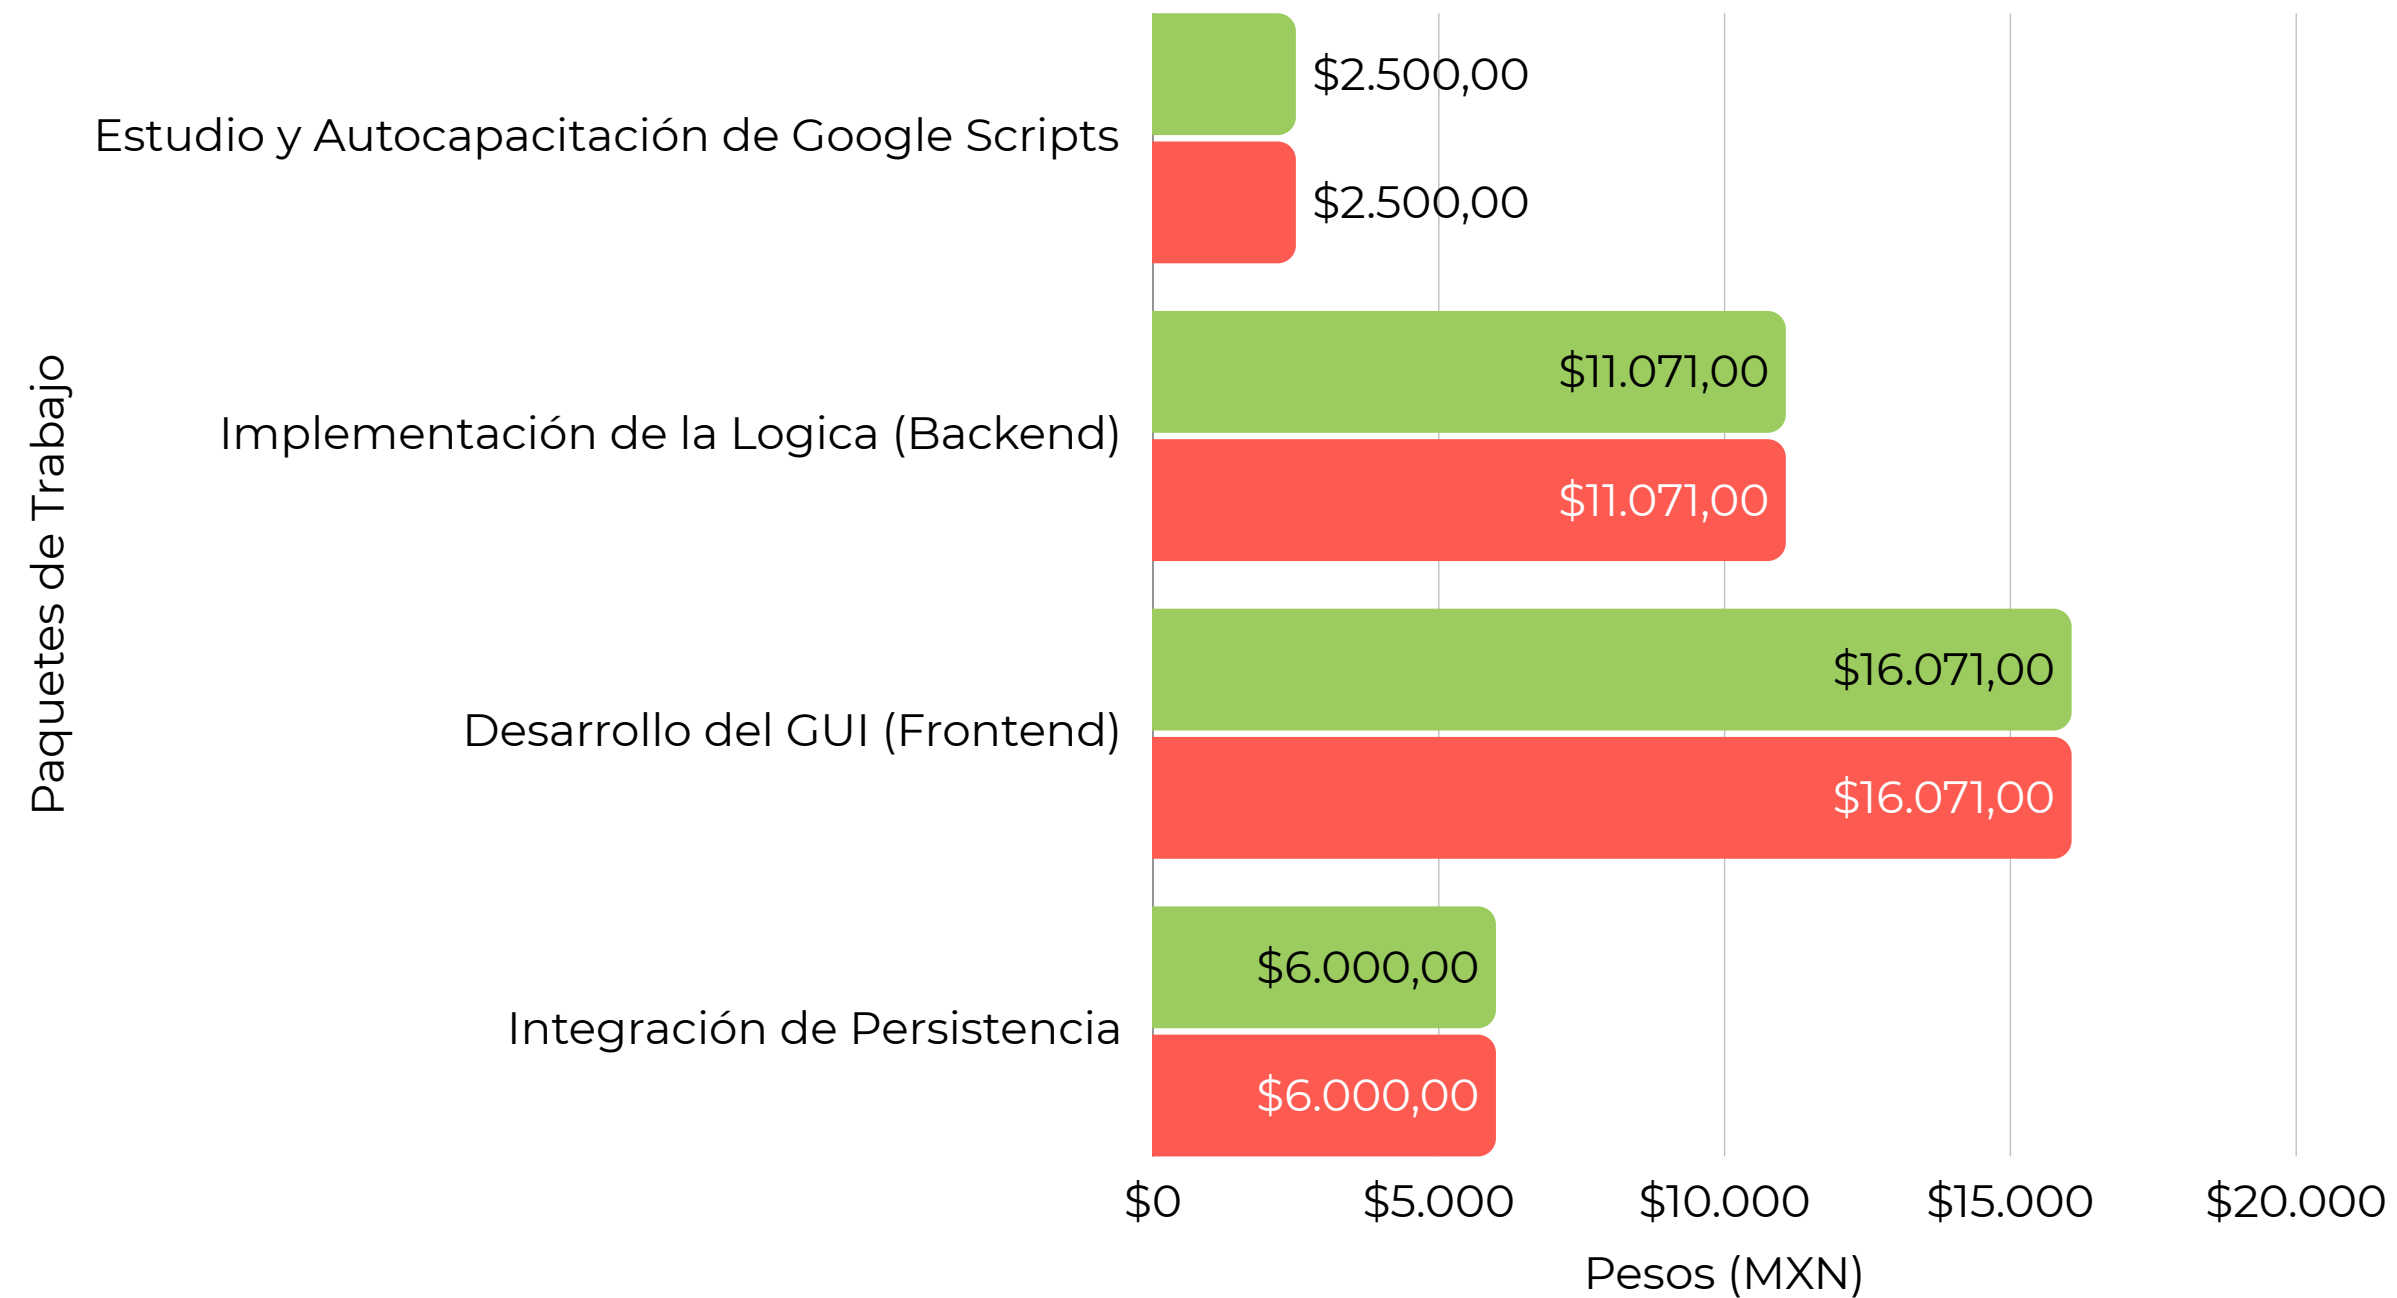

EVALUACIONES DE CALIDAD

Métrica	Objetivo	Resultado	Estado
Cobertura de pruebas unitarias	>80%	0%	Evaluado
Tiempo de respuesta API	<200 ms	1-3 Seg	Evaluado
Satisfacción de usuario	>4.5/5		Pendiente
Tasa de errores críticos	<5		Pendiente
Disponibilidad del sistema	>99%	Resultados esperados: 99%	Pendiente

CONCLUSIONES



Tiempo

El desarrollo del proyecto sigue atrasado por una semana.



Presupuesto

En cuestiones de presupuesto, se mantiene igual a lo estimado.



Avance

La mitad de las actividades se han realizado, 4 actividades realizadas en este nuevo avance.



Pruebas

Hace falta realizar mas pruebas y mejorar el rendimiento de la aplicacion

**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

